GF-TADs Africa

GLOBAL FRAMEWORK FOR THE PROGRESSIVE CONTROL OF TRANSBOUNDARY ANIMAL DISEASES

Food and Agriculture Organization of the United Nations

World Organisation for Animal Health
Founded as OIE

African Union

13e réunion du Comité de pilotage régional (CPR13) du GF-TADs Afrique

10 – 12 novembre 2026, Abuja, Nigeria



AFRICAN UNION
INTERAFRICAN BUREAU FOR ANIMAL RESOURCES

African Union - Pan African Veterinary Vaccine Centre
AU-PANVAC

Food and Agriculture Organization of the United Nations

World Organisation for Animal Health

Funded by the European Union

AFRICAN UNION INTERAFRICAN BUREAU FOR ANIMAL RESOURCES

African Union - Pan African Veterinary Vaccine Centre AU-PANVAC

Food and Agriculture Organization of the United Nations

World Organisation for Animal Health

Funded by the European Union

Programme panafricain PPR et PAPS

Deux ans d'action : ce qui bloque les progrès



Dr Jean-Marc Feussom et Dr Simon Kihu

Secrétariat panafricain de la PPR (PAPS) / UA-BIRA

Titre : 13e réunion du Comité de pilotage régional (CPR13) du GF-TADs Afrique

Date : 10 – 12 novembre 2026, Abuja, Nigeria

Trois messages pour le Comité de pilotage

Messages clés

La phase 1 pose les fondations

PAPS, quatre coordonnateurs CER, le CAG et ses quatre groupes de travail ; 24 PSN ; surveillance ou cartographie dans 28 des 30 pays cibles.

La vaccination est la prochaine épreuve

Aucune campagne financée par le programme. Zone tampon (1,05 M) : cartographie et enregistrement attendus ; fleuve Mano (750 000) : importation et chaîne du froid à régler.

Contraintes : données et financement

Missions de S&E (7 pays) : le frein, ce sont les données, le ciblage, la redevabilité et le financement récurrent, pas la production de vaccins. 58 M EUR (65 M USD) contre 1,3 milliard USD (dernière estimation du PAPS)

Nos deux recommandations : financement intérieur des plans nationaux, et jalons PPR dans le Plan stratégique du GF-TADs.

Suivi du CPR12 (Mbabane, mars 2025)

SUIVI **R11 : ressources nationales. R12 : plaidoyer de l'UA-BIRA, de la FAO et de l'OMSA.**

86 M USD
Campagne nationale de la Tanzanie, 5 ans

17
lettres d'engagement des États membres

2
chefs d'État champions de la PPR

50 M EUR
PPR2 (90 M EUR proposés au CPR12)

! **Ce qui a avancé, et ce qui n'a pas avancé**

R11 · **Les budgets nationaux financent déjà des campagnes** (Tanzanie : campagne de 86 M USD et 32 Md TZS soumis au Parlement ; Tchad ; Guinée, 1 M de doses), mais les PSN chiffrés ne sont que partiellement financés (ex. Éthiopie 35 %).

R12 · **Le plaidoyer a ouvert des portes** : deux chefs d'État champions, PPR2 adopté par l'UE (50 M EUR), une note conceptuelle à la BAD (7 M USD), l'OADA et la BIsD pour l'Afrique du Nord, et un projet du Fonds de lutte contre les pandémies : bassin du lac Tchad, réunions de Brazzaville et de Rome

ÉCART **Le financement reste insuffisant : 58 M EUR (65 M USD) de financement de l'UE contre 1,3 milliard USD (dernière estimation du PAPS, en cours de révision), d'où la recommandation 1 sur le financement national.**

Où en est l'Afrique sur la trajectoire PPR

PMAT · SEPT. 2026

40 des 55 États membres de l'UA aux stades 1–3 (validation PAPS, sept. 2026)

- **1** Stade 1 : 22
- **2** Stade 2 : 7
- **3** Stade 3 : 11
- **4** Stade 4 : 5*
- **F** Indemne (OMSA) : 6
- **Fh** Historiquement indemne : 2
- Suspendu : 1 (Maurice)
- **–** Non déclaré : 1

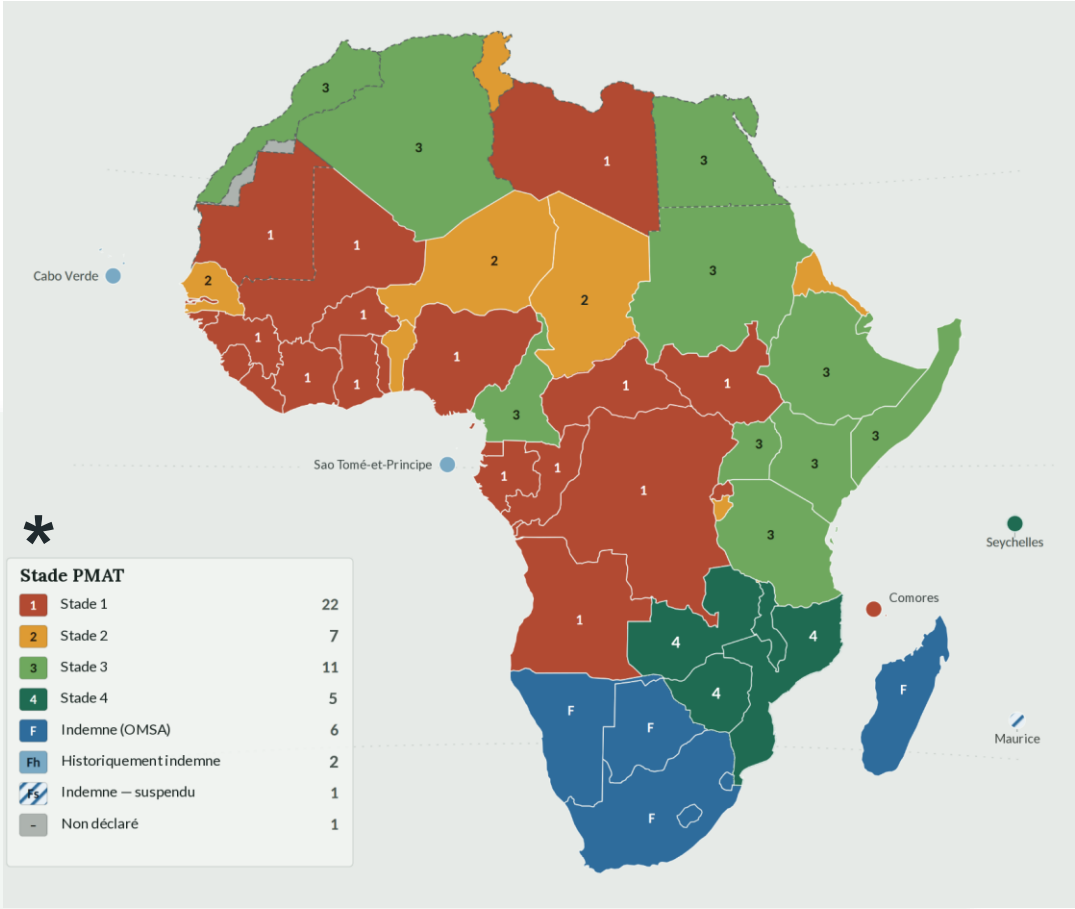

STATUT OFFICIEL

- Indemnes OMSA : 5 États membres et une zone en Namibie
- Dossiers à l'OMSA : Cabo Verde, Zimbabwe, Namibie (dernière zone) ; programme de contrôle tanzanien
- CEDEAO (2025) : 9 de plus au stade 2 ; à harmoniser
  - ** SADC, non validé par l'OMSA ; Malawi à confirmer*
  - ** Certains en auto-évaluation, à confirmer par le RAG*

PLUS-VALUE

Un stade PMAT de référence unique, validé par les RAG avec la FAO et l'OMSA (GTT 3 du CAG), est nécessaire pour l'évaluation à mi-parcours en cours et les situations de référence 2027–2031. *(Mise à jour en cours…)*

Le PPR1 face à son plan

TABLEAU DE BORD

Mois 24 sur 36 (note d'avancement PPR1, rapports AU-PANVAC et financiers, oct. 2026)

7 / 29

indicateurs du cadre logique atteints ; les 22 autres en cours

52 %

des 8 M EUR exécutés (4,16 M EUR) à 64 % du temps écoulé (23 oct. 2026)

24

pays dotés d'un PSN mis à jour ou validé *(activités en cours)*

28 / 30

pays cibles couverts par la surveillance ou la cartographie ; résultats de laboratoire en retard *(activités en cours)*

68 464

tests rendus possibles par 43 kits bELISA d'AU-PANVAC dans 22 pays (avr. 2025 – oct. 2026) *(activités en cours)*

35 / 48

pays formés à ARIS (4 des 6 langues de l'UA) ; 49 agents de 24 pays certifiés IATA

PAS ENCORE

Vaccination financée par le programme non démarrée : zone tampon (1,05 M) en attente de la cartographie demandée par l'Angola et la RDC et de l'enregistrement du vaccin ; fleuve Mano (750 000) : importation et chaîne du froid à régler.

Quatre régions, un programme

RÉGIONS

Détails dans les présentations des pays et des clusters qui suivent

Par CER

Afrique du Nord (hors PPR1) : stratégie de 141,5 M USD, avec l'OADA et la BIsD

CEEAC

EN COURS

(7) 90 % des sérums cibles collectés, analyses en attente ; 2 PSN ; Tchad : 19,2 M vaccinés

SADC / Zone tampon

EN COURS

(9) Surveillance de la zone tampon lancée ; sérologie pour les dossiers OMSA ; 4 PSN validés ; zone tampon approuvée par les ministres ; accord : voir le point RDC

CEDEAO

EN COURS

(6 + Togo) Enquêtes Bénin et Togo faites ; 9 PSN mis à jour, 5 à valider ; fleuve Mano : 750 000 ciblés

Corridors IGAD / CAE

EN COURS

(6 + Ouganda, Burundi) 4 terminées, 4 en cours ; 8 PSN validés ; 10 accords transfrontaliers signés

28 des 30 pays cibles sur la carte du programme

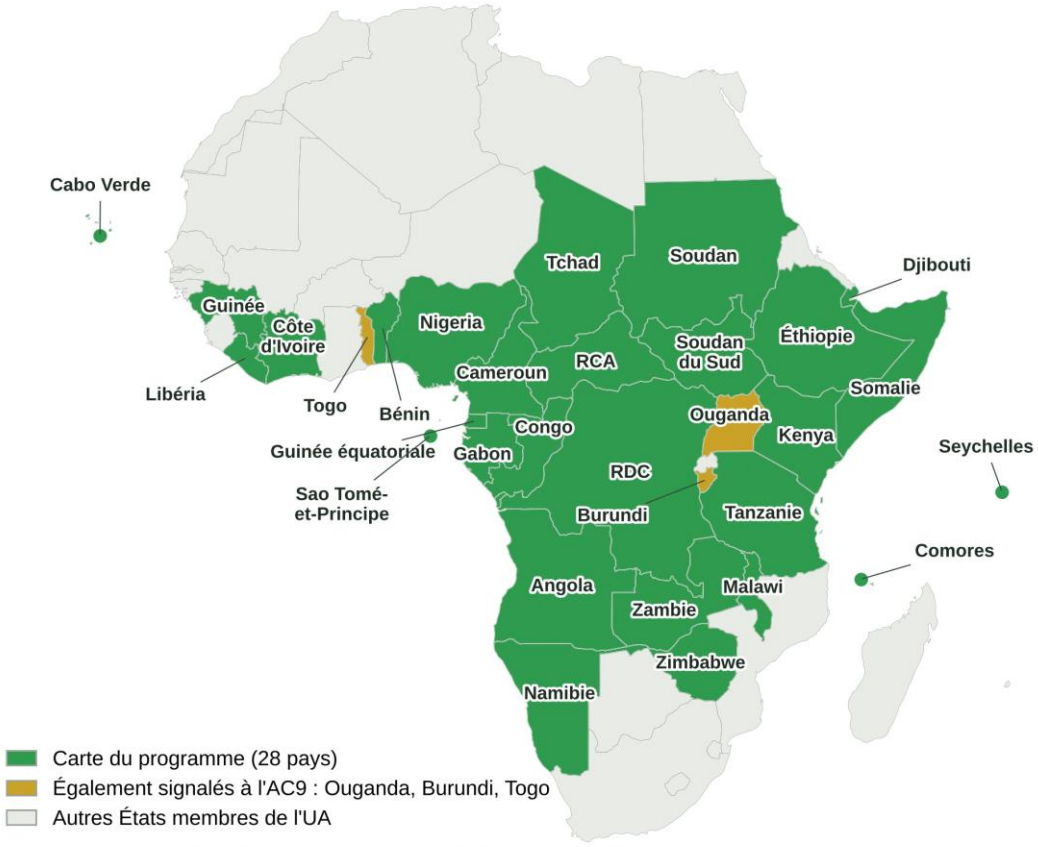

Source : carte du programme PAPS (revue de mi-année du CAG, août 2026) ; rapports IGAD/CAE et CEDEAO au 9e Comité consultatif PPR (oct. 2026). Fond de carte : Natural Earth 1:50m.

Ce qui nous freine

BLOCAGES **Missions de S&E dans 7 pays (juin–sept. 2026) : 8 contraintes de l'AC9 en 6 blocs.**

01
PSN encore à mettre à jour.

Plusieurs plans nationaux restent à mettre à jour, valider et chiffrer : la mise à jour des PSN doit se poursuivre dans chaque pays du programme.

02
Financement national très en deçà des besoins

Crédits nuls ou partiels ; pas de ligne budgétaire PPR dans plusieurs pays visités. La volonté politique ne se traduit pas encore dans les budgets.

03
Couverture sous le seuil d'immunité

De près de zéro à 17 % dans les zones visitées ; doses inadaptées aux effectifs, pas de microplans fondés sur le risque ; suivi post-vaccinal largement absent.

04
Capacités existantes sous-utilisées

PCR en panne, kits périmés, réactifs et étalonnages manquants ; des capacités accréditées côtoient des pays sans sérologie.

05
Transfrontalier : pas encore contraignant

Accord sur la zone tampon non signé (oct. 2026) ; un protocole suspendu, un autre sur un autre corridor ; coopération informelle non documentée.

06
Surveillance, données et effectifs

Pas de référence sérologique dans une partie de la zone tampon ; notification faible ; chiffres et stades PMAT discordants ; un pays : 80 vétérinaires sur 400 requis.

LEÇON **La contrainte déterminante tient aux données, au ciblage, à la redevabilité et au financement récurrent, pas à la capacité de production de vaccins ; le CAG et ses groupes de travail l'intègrent au plan de travail 2027 (Abidjan, nov. 2026).**

La suite : le PPR2 et la Stratégie de phase finale

12 PROCHAINS MOIS **Des fondations du PPR1 aux trajectoires d'éradication, épisystème par épisystème.**

Le plan : le PPR2 (50 M EUR, cinq ans, à partir de 2027) se concentre sur les **épisystèmes prioritaires**, et la Stratégie africaine de phase finale (Endgame) PPR 2027–2031 fixera les trajectoires nationales et transfrontalières à partir de situations de référence datées.

4/5 épisystèmes prioritaires proposés (PPR2)

Zone tampon australe, fleuve Mano, lac Tchad, Afrique de l'Est ; à confirmer par le CAG

Stratégie africaine de phase finale PPR 2027–2031

Note conceptuelle prête ; périmètre et calendrier de 24 semaines au CAG (16–17 nov.) ; finalisation au S1 2027

Jalons immédiats

PSN validés et chiffrés d'ici mi-2027 ; réunion ministérielle et accord sur la zone tampon ; un protocole d'échantillonnage unique

Coût de la vaccination sur 3 ans par stratégie (projet FAO, 2025)

408 M USD
Vaccination de masse, 42 pays

282 M USD
Couverture progressive (nouveau-nés)

184 M USD
Par épisystème, 9 épisystèmes

CIBLAGE **La vaccination par épisystème est modélisée à 184 millions USD contre 408 millions USD pour une couverture de masse (−55 % ; vaccination seule, projet FAO 2025). Là où le statut est inconnu : cartographier, rétablir le diagnostic et valider les PSN, puis vacciner selon le risque.**

Financer l'éradication : l'écart et l'argumentaire

FINANCEMENT

Rendements élevés, écart important, plateforme commune pour le combler.

33,8 : 1

ratio bénéfice-coût de l'éradication mondiale de la PPR

58 M EUR

Financement de l'UE : PPR1 8 M EUR + PPR2 50 M EUR

1,3 milliard USD

(Dernière estimation du PAPS, en cours de révision),

35 %

du PSN chiffré de l'Éthiopie (69,3 M USD) mobilisés (VSF 2025)

A Un enjeu économique majeur

Jones et al. (2016) estiment un ratio bénéfice-coût de 33,8 et un TRI de 199 % pour un programme mondial d'éradication sur 15 ans : les retards réduisent les rendements, mais l'argument reste solide.

B Une plateforme commune

Recommandation du groupe financement de l'AC9 : plateforme commune de mobilisation des ressources PPR pilotée par le Secrétariat PPR avec le PAPS/UA-BIRA, et mécanisme régional mutualisé géré par l'UA-BIRA ; plan de mobilisation en préparation.

POINT CLÉ

Les partenaires financent les priorités nationales : la PPR doit être défendue auprès des ministères des Finances, avec des PSN chiffrés et des preuves de rendements économiques et sociaux.

Deux projets de recommandations pour le CPR13

Proposées

R1 · Financer les plans nationaux chiffrés

Les États membres ouvrent une ligne budgétaire PPR, même modeste, au budget 2027 (ou 2027/28) pour les PSN chiffrés et les coûts récurrents ; rapport annuel au CAG via les CER.

R2 · La PPR dans le Plan du GF-TADs

Le secrétariat du GF-TADs, avec l'UA-BIRA et la FAO, fixe des jalons et indicateurs PPR dans le Plan stratégique régional 2027–2031, aligné sur la Stratégie de phase finale.

Suivi au CPR14

Le PAPS rend compte du nombre d'États membres dotés d'une ligne budgétaire PPR, de la part du coût des PSN qu'elle couvre et des jalons PPR du Plan.

R6 du CPR12 : deux au plus par session. R1 rend la R11 mesurable ; R2 répond au mandat du CPR12 pour le Plan.

AFRICAN UNION INTERAFRICAN BUREAU FOR ANIMAL RESOURCES
AU-PANVAC
Food and Agriculture Organization of the United Nations
World Organisation for Animal Health
Funded by the European Union

GF-TADs Africa

GLOBAL FRAMEWORK FOR THE PROGRESSIVE CONTROL OF TRANSBOUNDARY ANIMAL DISEASES

Food and Agriculture Organization of the United Nations

World Organisation for Animal Health
Founded as OIE

African Union

Thank you | Merci | شكراً لك | Obrigado | Gracias | Asante

www.au-ibar.org repository.au-ibar.org networks.au-ibar.org @au_ibar

The Pan-African PPR Secretariat (PAPS)

Pan African Program for the Eradication of Peste des Petits Ruminants (PPR) and the Control of other Priority Small Ruminant Diseases

Uniting Africa for a PPR-Free Future
